

工 事 名 : 平成〇〇年度 市営浄化槽事業〇〇地区(その〇)浄化槽設置工事

履行場所 : 佐賀市〇〇町大字〇〇地内

工事検査書類(例)

工期
自 平成26年〇〇月〇〇日
至 平成26年〇〇月〇〇日

株式会社 〇〇工務店

提出日 平成26年〇〇月〇〇日

課 長	係 長	一般監督員

現場代理人	主任技術者

工事検査主要提出書類(施工業者用)

(H20.7.11以降検査実施)

分類	提出書類等	備考	提出時期	対象
工事カルテ	工事カルテ受領書(写)	監督員の確認を受けた後登録	受注、変更、竣工時	請負金額2,500万円以上の工事
			受注時	請負金額500万円以上の工事
施工体制	下請申請願		下請負契約の前	下請契約を行う全ての工事
	市外業者採択理由書		下請業者決定時	
	施工体制台帳	工事現場に備えとともに、監督員に提出	当初:下請契約後速やかに 変更:変更発生後速やかに	下請請負総額3000万円以上の工事
	施工体系図(それぞれの下請契約金額記入)			
	下請の契約書等の写	・1件50万円以上の契約 ・下請請負総額3000万円以上の工事は全て添付必要	下請契約後速やかに	請負金額130万円以上の工事
	下請の技術者の資格を証する書面	資格証明書等若しくは経歴書		
施工計画	施工計画書	共通仕様書参照	当初:工事に着手する前 変更:計画に変更を生じた部分を、施工前に	全ての工事
	使用材料承認願			申請が必要な工事
	各種法令許可証の写し等			
副産物	再生資源利用計画書		施工計画書提出時	「佐賀市建設副産物処理方針」及び「佐賀市建設副産物再生利用方針」の規定による
	再生資源利用促進計画書			
	再生資源利用実施書		成工検査書類提出時	
	再生資源利用促進実施書			
安全管理	安全訓練実施報告書		翌月5日まで(毎月)	全ての工事
	店社バトロール実施報告書			
	その他安全管理に関する管理図書	毎日実施されているものについては1(回/月)分の写しを添付(その他は検査時に提示)	成工検査書類提出時	全ての工事
	〔検査時に提示〕 その他安全管理に関する管理図書	原本の提示	成工検査時も可	全ての工事
	事故報告書		事故発生後7日以内	事故があった場合
産業	産業廃棄物処理委託契約書の写		産業廃棄物の処理にかかる前まで	産業廃棄物の処理を他に委託する工事
	産業廃棄物処理許可証の写			
	集計表		成工検査書類提出時	
	〔検査時に提示〕 産業廃棄物管理票(マニフェスト)	マニフェストの提示 (5年保存となっており工事完了後提示を求められればこれに依じる。)	成工検査時も可	
退職金制度	建設業退職金共済組合掛金収納書		契約後1ヶ月以内	建退共証紙を購入した全ての工事
	建設業退職金共済証紙配布先一覧表等	証紙貼付の写しは不要(氏名記載部写しは必要)	成工検査書類提出時	建退共証紙を配布した全ての工事
	建設業退職金共済証紙配布辞退書	退職金制度証明書類添付		下請業者の退職金制度が建退共以外による場合
	作業従事者出陣簿			全ての工事
工程管理	計画工程表		施工計画書提出時	全ての工事
	変更計画工程表		工程計画を変更した場合	
	突進工程表		成工検査書類提出時	
	工事履行報告書		翌月5日まで(毎月)	請負代金500万円以上の工事
施工管理	工事打合簿		その都度	指示・協議・通知・承諾・提出・報告等が必要な工事
	出来高数量表		成工検査及び出来形検査書類提出時	全ての工事
	出来形数量及び出来形図表等			
	品質管理書類等			
	工事写真			
	材料検収書類等	可視部分の工場二次製品については精品伝票は添付不要		
	社内検査報告書	下請業者に対する完了検査も行うこと		

目 次

1 工程管理

2 出来形管理

- 2－1 浄化槽出来形管理様式
- 2－2 市営浄化槽出来形管理表
- 2－3 漏水試験記録表
- 2－4 佐賀市市営浄化槽設置工事施工チェックリスト（社内検査実施報告書）

3 写真管理

4 安全管理

- 4－1 新規入場時等教育実施報告書
- 4－2 危険予知活動・安全日報

5 品質管理

- 5－1 コンクリート試験成績書
- 5－2 コーン貫入試験結果書

6 再生資源利用促進実施書(参考)

7 建退共

- 7－1 建設業退職金共済組合掛金収納書
- 7－2 作業従事者出面簿
- 7－3 建設業退職金共済証紙配布先一覧表（下請けある場合）

● 实施

■ : 計画

实施

月	4																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
工種																																
準備工																																
土工																																
浄化槽据付工																																
上部スラブエ																																
後片付け																																
書類作成																																
検査																																

5人槽

出来高数量総括表

1基

[illegible]

1. 基本情報


申請者氏名	浄化槽 花子	設置場所	佐賀市若宮三丁目6番60号
人槽	7	基礎杭	有り(め 12 mm・ 2 m× 4 本)・ 無し
		未完成箇所	

2. 確認事項

- ① 基準点について : 場所〔放流先側溝天端〕を基準点とし、標高を〔9.730〕とする。
- ② GLについて : 基準点から〔270〕mm 下り・上りをGLとする。標高〔10.000〕
- ③ スラブ高について : GLから〔30〕mm 下り・上りをスラブ高とする。標高〔10.030〕
- ④ 流入管について : 〔GL〕から〔400〕mm 下り・上りを流入管管底高とする。
- ⑤ 駐車場仕様について : 駐車場仕様と〔する・しない〕

	会社名	担当者	連絡先	確認日
①の確認先	△△ホーム	□□ ××	090-1234-××××	H 26 年 4 月 1 日
②の確認先	〃	〃	〃	H 26 年 4 月 1 日
③の確認先	〃	〃	〃	H 26 年 4 月 1 日
④の確認先	〇〇工務店(自社)	☆☆(排水設備担当)	090-1234-××××	H 26 年 4 月 1 日
⑤の確認先	申請者	浄化槽 花子	090-1234-××××	H 26 年 4 月 1 日

3. 出来形管理図

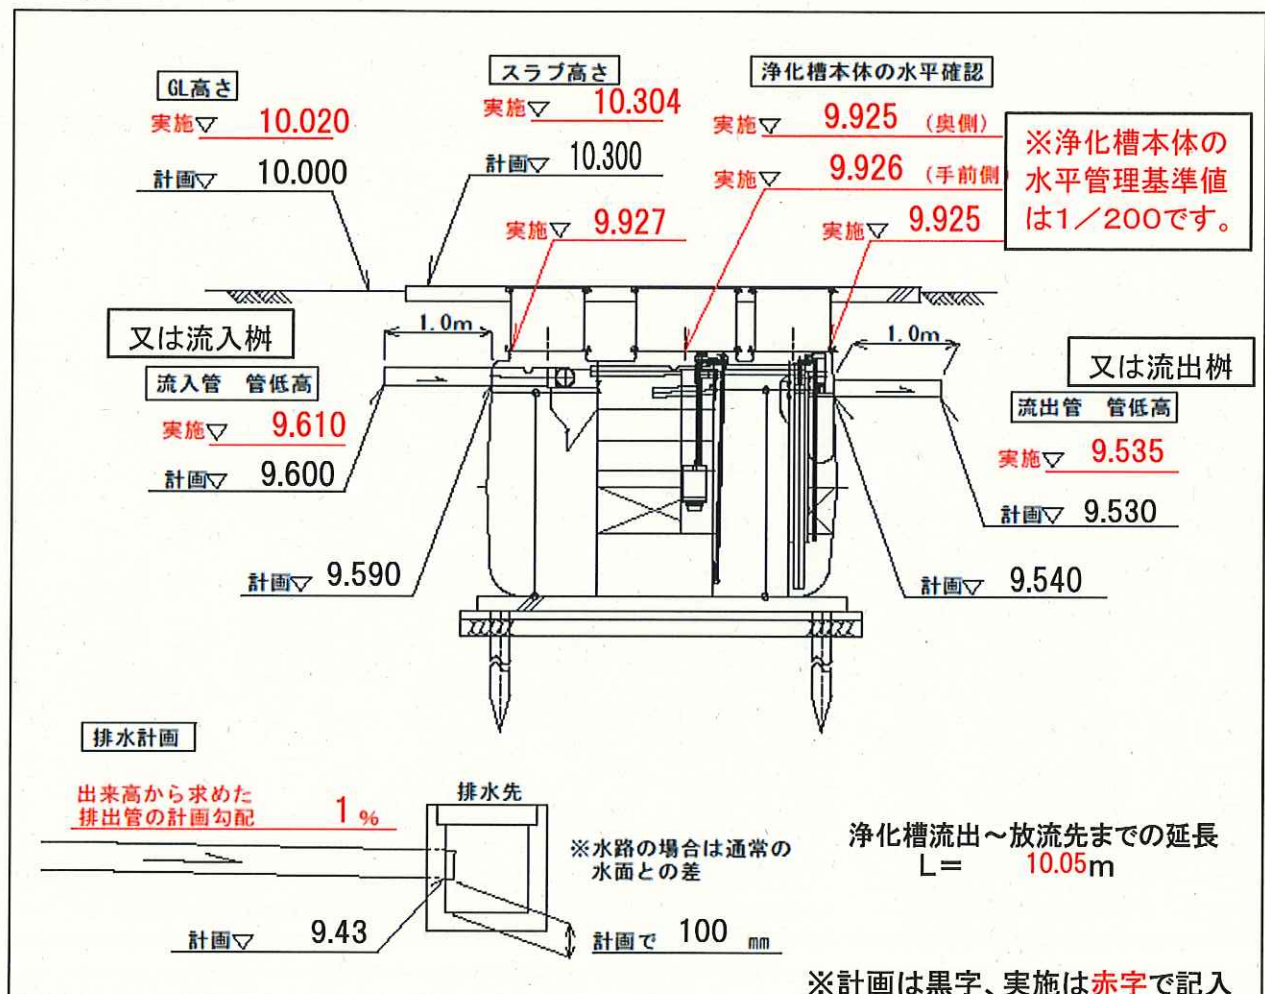

4. 備考 (部分使用検査時に必要なもの)

- ①本票 ②工事写真 ③レベル・スタッフ ④水張り試験結果

市営浄化槽 (出来形) 計画 管理表		申請者氏名 設置場所	〇〇 〇〇様 佐賀市〇〇地内	人槽	7
--------------------	--	---------------	-------------------	----	---

※緑色に着色した箇所を記入すること

設置機種	フジクリンOE-7	駐車場仕様	無	ポンプ仕様	無
------	-----------	-------	---	-------	---

	①	②	③	④
実施値	1955	95		
計画値	1950	100	310	360
差	5	-5		
管理基準値	±30mm	+300mmまで		

- ① 掘削深(製品高+②嵩上げ高+⑤+⑥+⑦)
 ② 嵩上げ高
 ③ 製品固有の流入高(固定)
 ④ 製品固有の流出高(固定)

※頂版コンクリートは、GLより3cm程度高く仕上げること

	⑤	⑥	⑦	⑧
実施値	1500	800	390	465
計画値	1000	1000	400	470
差	500	-200	-10	-5
管理基準値	±30mm	±30mm	±30mm	±30mm



- ⑤ 本体から流入樹までの距離
 ⑥ 本体から流出樹(側溝)までの距離
 ⑦ ②+③-⑤/100 ≤ ⑦
 ⑧ ②+④+⑥/200 ≥ ⑧

	⑨	⑩	⑪
実施値	10500	290	
計画値	10000	300	270
差	500	-10	
管理基準値	±30mm	±30mm	


⑩ ②+④+⑨/200+100 ≤ ⑩+⑪

※浄化槽の放流管底は、水面+10cm以上かつ勾配が1/200以上であることを確認すること

※水面+10cmが確保できない場合は、逆流の恐れがないことを確認または、浄化槽係に事前相談を。

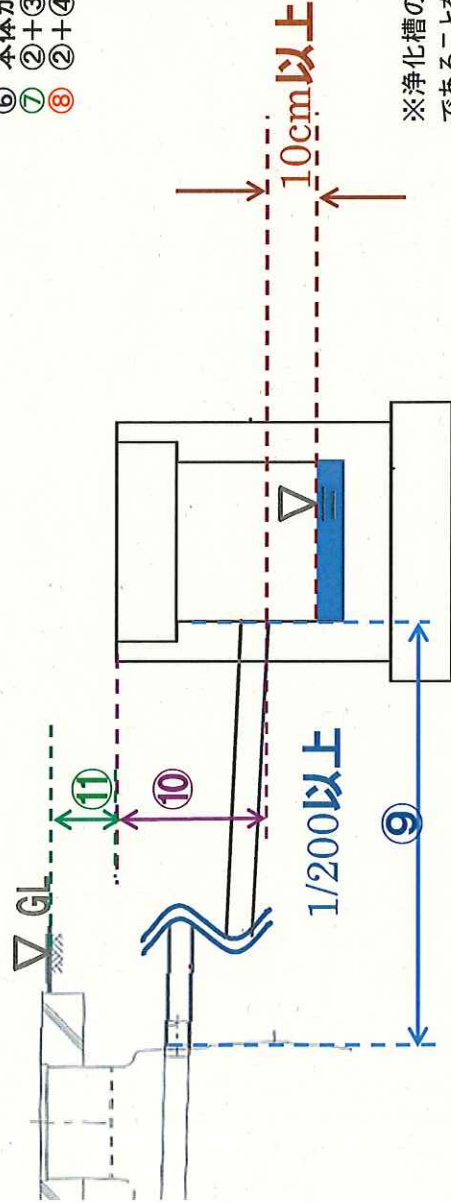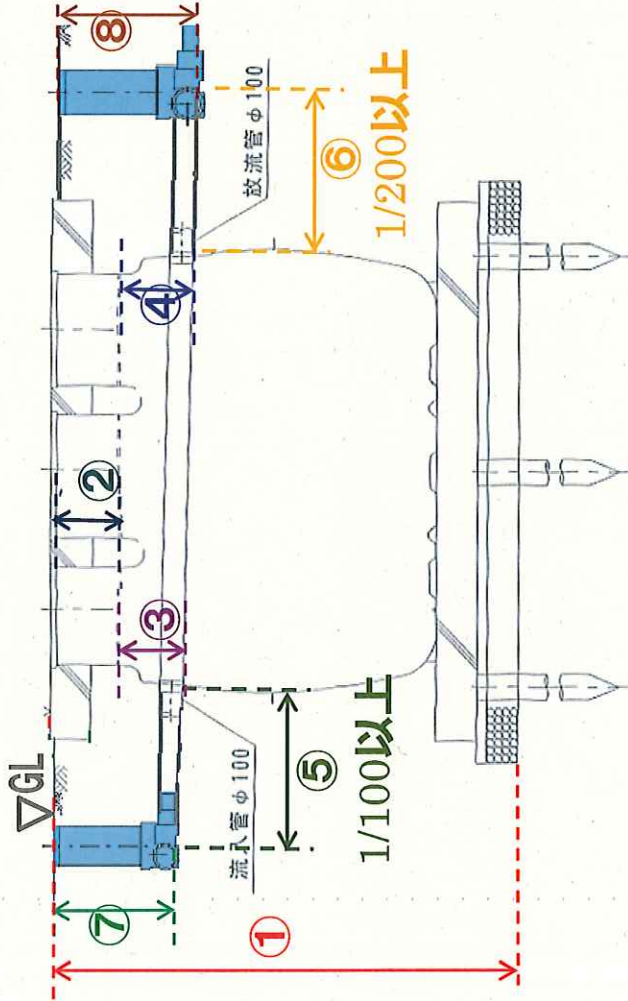


頂板コンクリート

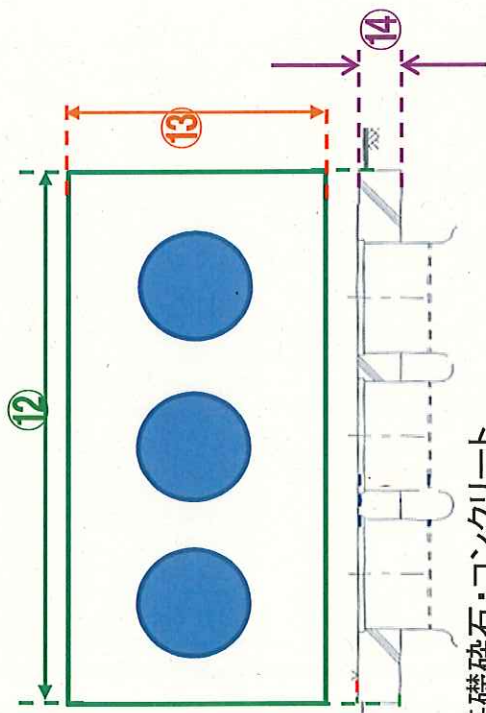

	⑫	⑬	⑭
単位 mm			
実施値	2520	1520	100
計画値	2500	1500	100
差	20	20	0
管理基準値	計画値以上	計画値以上	計画値以上

- ⑪ 頂板コンクリート長さ
- ⑫ 頂板コンクリート幅
- ⑬ 頂板コンクリート厚

基礎砕石・コンクリート

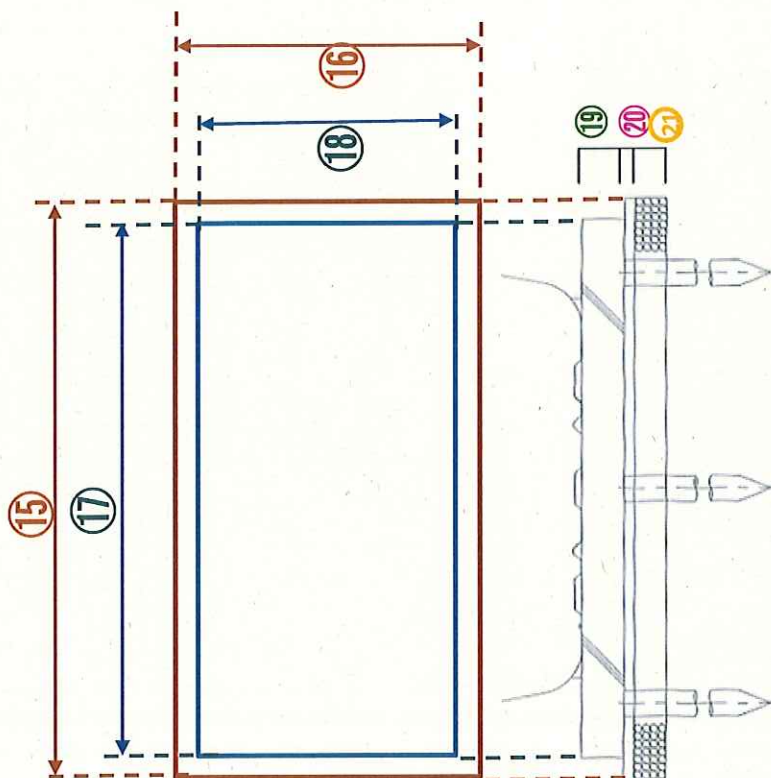

	基礎砕石	基礎コンクリート	単位 mm
	⑮	⑯	⑰
実施値	2700	1700	2520
計画値	2700	1700	2500
差	0	0	20
管理基準値	計画値以上	計画値以上	計画値以上

	単位 mm	本
	⑱	⑲
実施値	100	50
計画値	100	50
差	0	0
管理基準値	計画値以上	計画値以上

- ⑱ 底盤コンクリート厚
- ⑲ 均しコン厚
- ⑳ 砕石厚

佐賀市市営浄化槽設置工事施工チェックリスト

検 査 項 目	チェックポイント	確認
1 高さ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。(30cm 以内か)	✓
2 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	✓
	保守点検及び清掃の支障となるものが設置されていないか。	✓
	コンクリートスラブが打たれているか。	✓
3 漏水の有無	漏水が生じていないか。	✓
4 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	✓
5 接触材等の変形、破損及び固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損がないか。	✓
	しっかり固定されているか。	✓
6 ばっ気装置、逆洗装置破損、汚泥移送装置の変形、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損がないか。	✓
	しっかり固定されているか。	✓
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	✓
7 消毒設備の変形破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	✓
	しっかり固定されているか。	✓
8 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置及び稼働の状況	ポンプますに変形や破損はないか。	1
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	1
	ポンプが2台以上設置されているか。	1
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	1
	ポンプの固定が十分行われているか。	1
	ポンプの取りはずしが可能か。	1
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	1
9 ブローターの設置及び稼働の状況	防振対策がなされているか。	✓
	固定が十分行われているか。	✓
	アースはなされているか。	✓
	漏電のおそれはないか。	✓
10 写真管理 【浄化槽設置】	着工前に合併処理浄化槽設置場所で浄化槽設備士が標識を掲げている写真	✓
	碎石の転圧終了後	✓
	基礎配筋（被り・ラップ長）	✓
	擁壁の配筋（被り・ラップ長）	1

	支柱等補強配筋（定着長）	—
	コンクリート打設置後（出来形）	✓
	設置前の浄化槽本体（全景・品番）	✓
	据付及び水平	✓
	水張り	✓
	埋め戻し水締め	✓
	上部スラブ配筋（被り・ラップ長）	✓
	かさ上げ	✓
	ピット構造	—
	ブロワ設置状況（アースの確認）	✓
	ポンプ設備の写真	—
	合併処理浄化槽完了後	✓
10 写真管理 【単独浄化槽撤去】	既存単独浄化槽又はくみ取り便槽の全景	—
	し尿・汚泥くみ取り	—
	消毒	—
	残置する部分	—
	掘り上げた本体	—
	掘り上げ状況	—
	既存し尿施設の埋め戻し水締め	—
	既存し尿施設の撤去完了後	—
10 写真管理	管理者が必要と認めたものの写真	—

社内検査員

氏 名

浄化槽次郎




漏水試験記録表

◎測定日 : 4月12日 (土) ~ 4月14日 (月) 測定箇所: 〇〇 宅 地先

	測定時刻	経過時間	水位高さ (H)	摘 要
給水完了	12日17時00分	0時間	300 (mm)	
測 定				
第1回測定	12日17時00分	時間 分	300 (mm)	
第 回測定				
第 回測定				
(最終測定) 第 回測定	14日 9時00分	40時間	300 (mm)	

※ 測定回数は、現場状況に応じることとします。

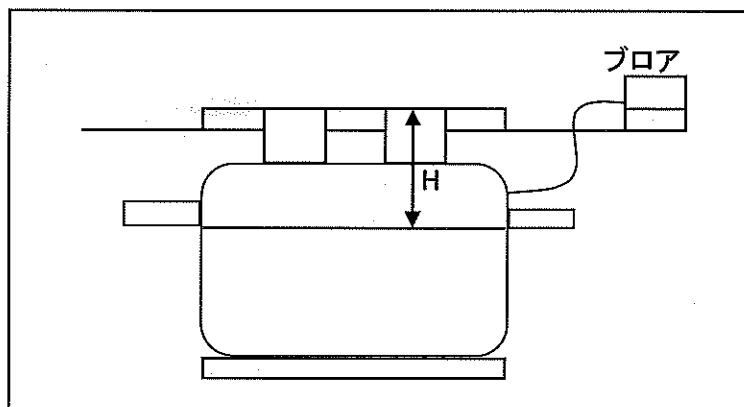



No.: 1
 工事名: 市営浄化槽事業
 ○○地区(その○)
 △△邸 5人槽

写真タイトル: 着工前



No.: 2
 工事名: 市営浄化槽事業
 ○○地区(その○)
 △△邸 5人槽

写真タイトル: 着工前(接写)



No.: 3
 工種:

写真タイトル: 竣工




No.: 4
工種: 立坑

写真タイトル: 機械掘削状況



No.: 5
工種: 立坑

写真タイトル: 機械積込 状況

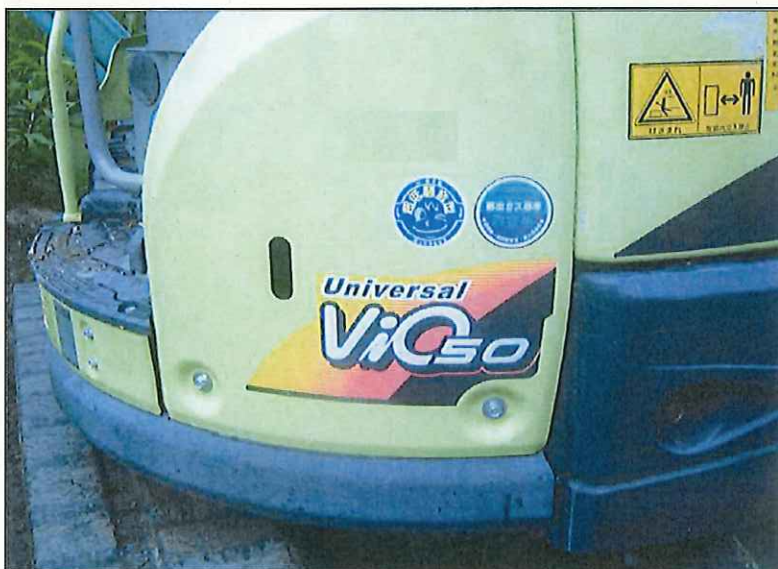

No.: 6
工種: その他

写真タイトル: 排出ガス対策型
バックホウ




No.: 7
工種: 土留め工

写真タイトル: 材料検収
(アルミ矢板)

計画値 L=2500mm

実測値 2500

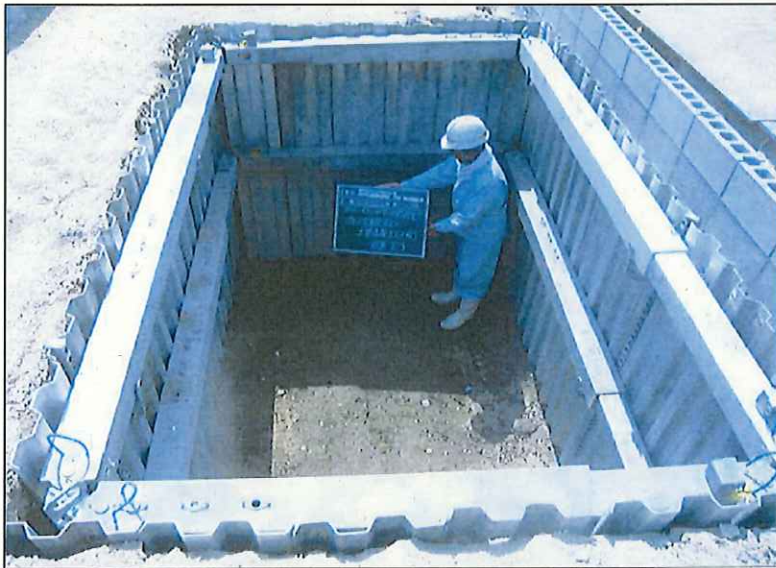

No.: 8
工種: 土留め工

写真タイトル: 土留め支保工(2段)
設置完了



No.: 9
工種: 立坑土工

写真タイトル: 床掘確認

計画値 H=1950mm

実測値 1950



No.: 10
工種: 立坑土工

写真タイトル: 床掘確認

計画値 H=1950mm

実測値 1950



No.: 11
工種: コーン貫入試験

写真タイトル: コーン貫入試験
実施状況



No.: 12
工種: コーン貫入検査

写真タイトル: コーン貫入試験
実施状況(接写)



No.: 13
工種: 基礎工

写真タイトル: 材料検収
(基礎杭)

計画値 L=3000mm

実測値 3000

計画値 $\phi = 120\text{mm}$

実測値 120




No.: 14
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎杭建込み状況



No.: 15
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎杭建込み完了

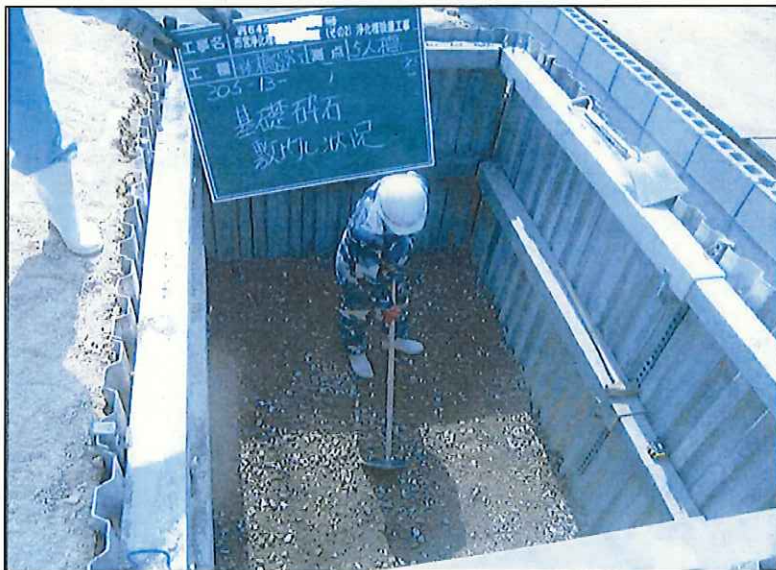

No.: 16
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石
敷均し状況



No.: 17
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石
転圧状況



No.: 18
工種: 基礎工


写真タイトル: 基礎碎石出来形確認

計画値 W1=1400

W2=2500

実測値 W1=1400

W2=2500

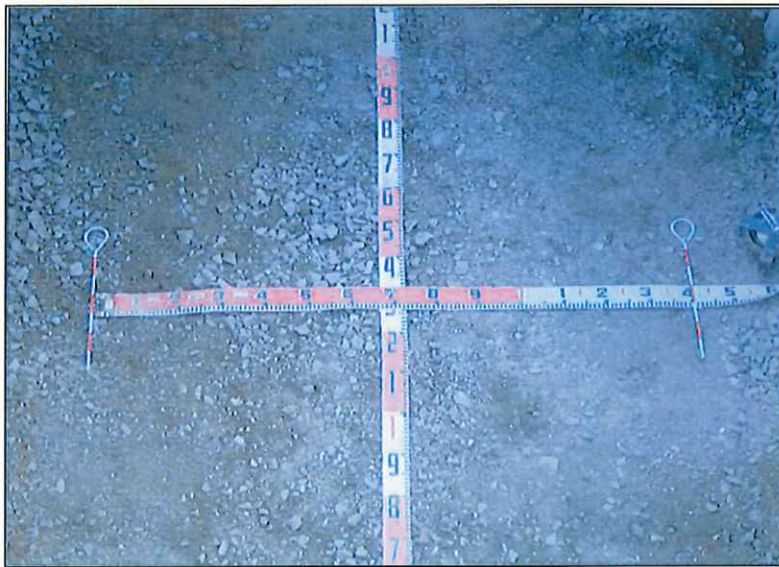

No.: 19
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石出来形確認
(接写)

計画値 W1=1400

W2=2500

実測値 W1=1400

W2=2500



No.: 20
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石出来形確認
(接写)

計画値 W1=1400

W2=2500

実測値 W1=1400

W2=2500



No.: 21
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石出来形確認
碎石厚(t)

計画値 t=100

実測値 t=110



No.: 22
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎碎石出来形確認
碎石厚(t) (接写)

計画値 t=100

実測値 t=110



No.: 23
工種: 基礎工

写真タイトル: 均しコンクリート
打設状況

計画値 t=50

実測値 t=50



No.: 24
工種: 基礎工

写真タイトル: 均しコンクリート
打設完了



No.: 25
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎配筋状況

計画値 L=2700
W=1100
D-13 @-200
実測値 L=2700
W=1100
D-13 @-200



No.: 26
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎配筋状況(接写)

計画値 L=2700
W=1100
D-13 @-200
実測値 L=2700
W=1100
D-13 @-200



No.: 27
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎配筋状況(接写)

被り 下=50



No.: 28
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎コンクリート
施工状況



No.: 29
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎コンクリート
出来形確認

計画値 L=2200
W=1150
t=150

実測値 L=2200
W=1150
t=150



No.: 30
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎コンクリート
出来形確認(接写)

計画値 L=2200
W=1150
t=150

実測値 L=2200
W=1150
t=150

駐車場仕様の場合



No.: _____
工種: その他

写真タイトル: 駐車場仕様
配筋確認状況

フープ筋 D-10 @-100


主筋 D-13 4本



No.: _____
工種: その他

写真タイトル: 駐車場仕様
支柱設置完了


ボイド管を剥いで、コンクリートが充填されていることが確認できる写真

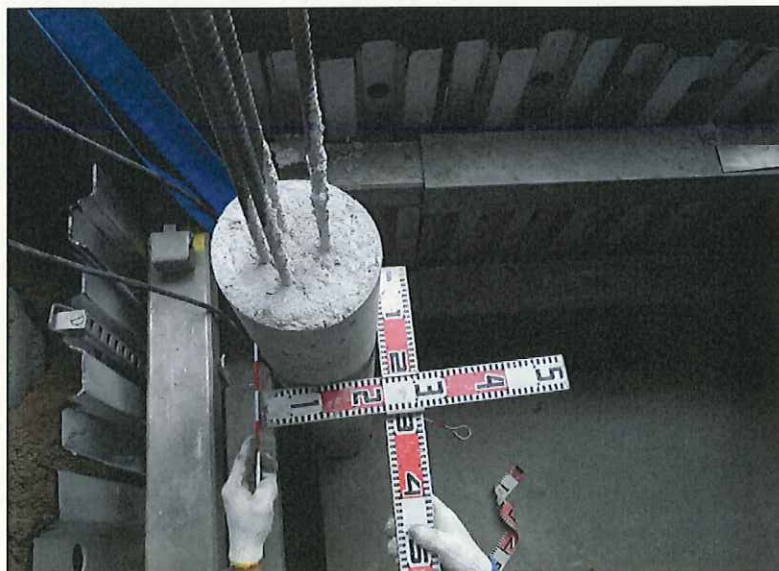

No.: _____
工種: その他

写真タイトル: 駐車場仕様
支柱設置完了

径 200mm

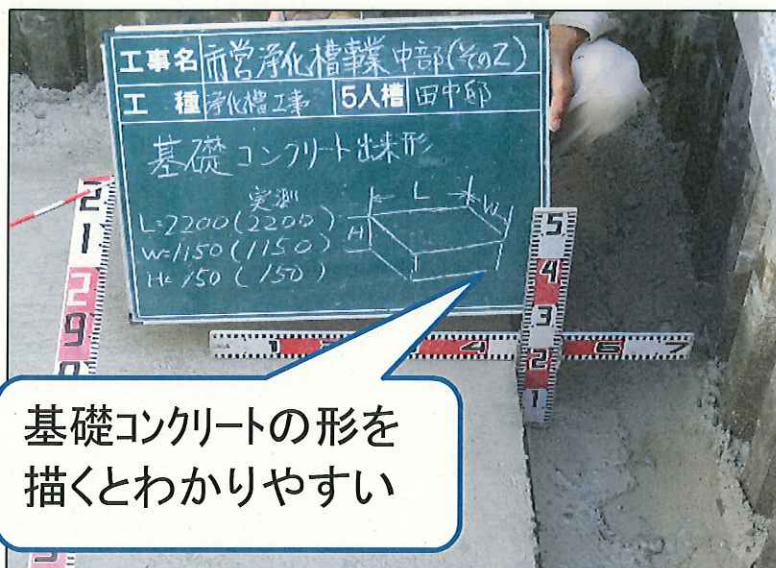

No.: 31
工種: 基礎工

写真タイトル: 基礎コンクリート
出来形確認(接写)

計画値 L=2200
W=1150
t=150

実測値 L=2200
W=1150
t=150



No.: 32
工種: 浄化槽据付工


写真タイトル: 浄化槽据付状況



No.: 33
工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 浄化槽据付
水平確認状況

浄化槽設備士が確
認

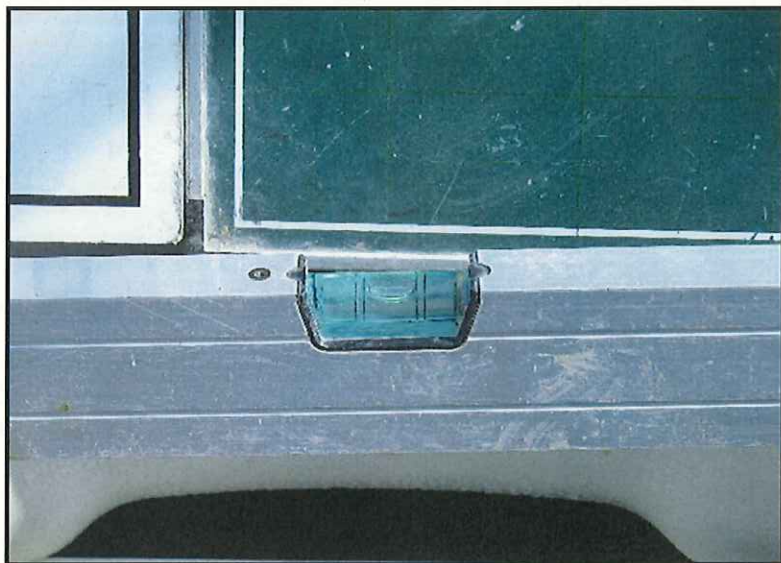

No.: 34
工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 浄化槽据付
水平確認状況(接写)




No.: 35
工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 漏水検査実施状況

開始日時 5月26日AM9:14

H=300

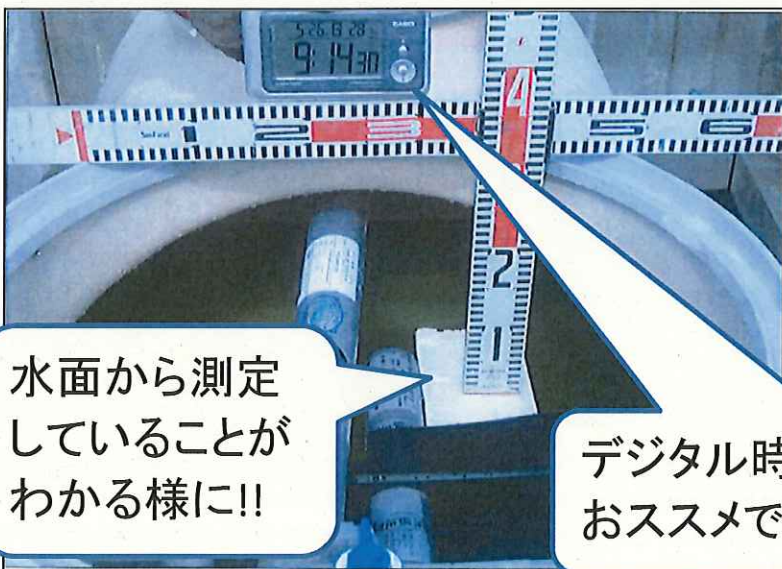

No.: 36
工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 漏水検査実施状況
(接写)

開始日時 5月26日AM9:14

H=300

水面から測定
していることが
わかる様に!!

デジタル時計を使った管理は
おススメです。



No.: 37
 工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 漏水検査実施状況

開始日時 5月26日AM9:14

H=300

完了日時 5月27日AM9:16

H=300



No.: 38
 工種: 浄化槽据付工


写真タイトル: 漏水検査実施状況
 (接写)

開始日時 5月26日AM9:14

H=300

完了日時 5月27日AM9:16

H=300

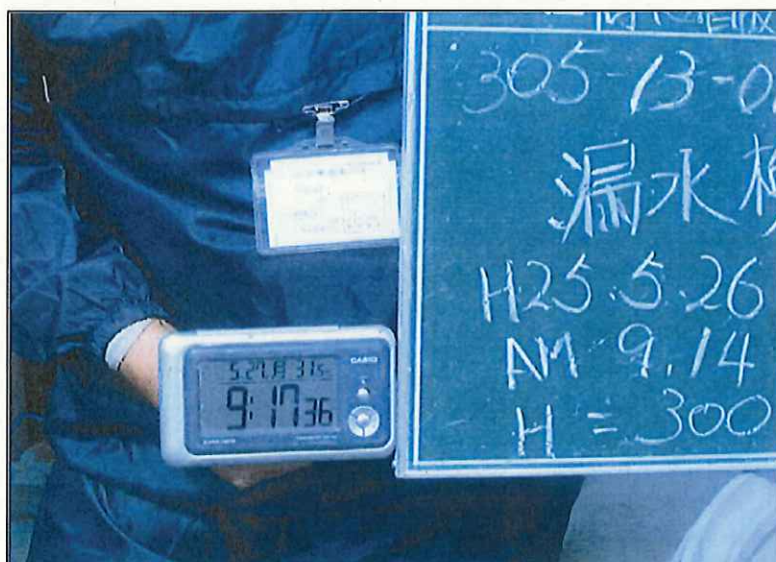

No.: 39
 工種: 浄化槽据付工

写真タイトル: 漏水検査実施状況
 (接写)

開始日時 5月26日AM9:14

H=300

完了日時 5月27日AM9:16

H=300



No.: 40
工種: 埋戻工

写真タイトル: 砂埋戻し実施状況

2層目 H=1000mm



No.: 41
工種: 埋戻工

写真タイトル: 砂埋戻し実施状況

4層目 H=400mm



No.: 42
工種: 埋戻工

写真タイトル: 砂埋戻し水締め
実施状況



No.: 43
工種: その他

写真タイトル: 流入管取付完了

流入桝の同時施工も可能です。
流入桝までは
L=1,000mmより
短くても長くても
O.K.です。



No.: 44
工種: その他

写真タイトル: 放流管取付完了

流出桝の同時施工も可能です。
流出桝又は放流
先側溝等までは
L=1,000mmより
短くても長くても
O.K.です。



No.: 45
工種: その他

写真タイトル: 嵩上げコーキング
状況



No.: 46
工種: その他

写真タイトル: 嵩上げコーキング
状況



No.: 47
工種: その他

写真タイトル: 嵩上げ高確認

H=210



No.: 48
工種: ブロワ据付工

写真タイトル: ブロワ配管状況



No.: 49
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: 上部スラブ
配筋状況

計画値 L=2100
W=1020
D-13 @-200
実測値 L=2100
W=1020
D-13 @-200



No.: 50
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: 上部スラブ
配筋状況(接写)


計画値 L=2100
W=1020
D-13 @-200
実測値 L=2100
W=1020
D-13 @-200



No.: 51
工種: 上部スラブ工
測点:

写真タイトル: 配筋状況

被り 下=50

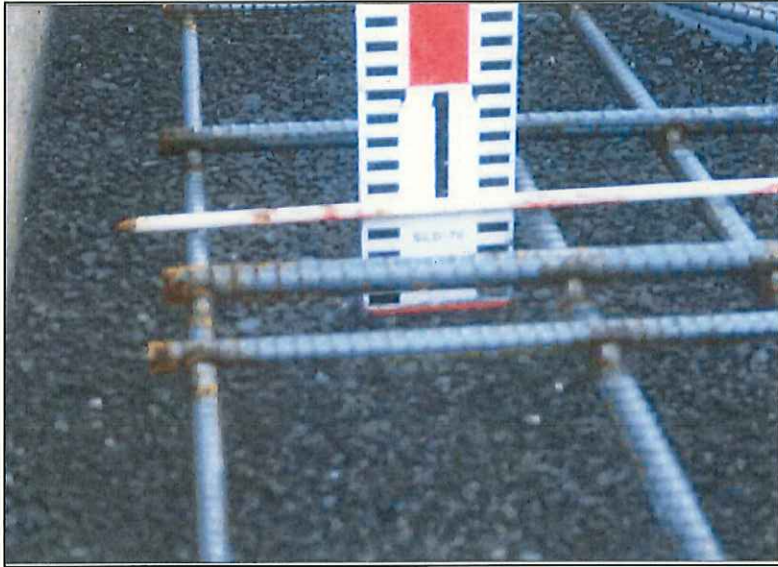

No.: 52
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: 配筋状況(接写)

被り 下=50



No.: 53
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: スラブコンクリート
出来形確認

計画値 W1=1200

W2=2500

t=100

実測値 W1=1220

W2=2520

t=100



No.: 54
工種: 上部スラブ工


写真タイトル: スラブコンクリート
出来形確認(接写)

計画値 W1=1200

W2=2500

t=100

実測値 W1=1220

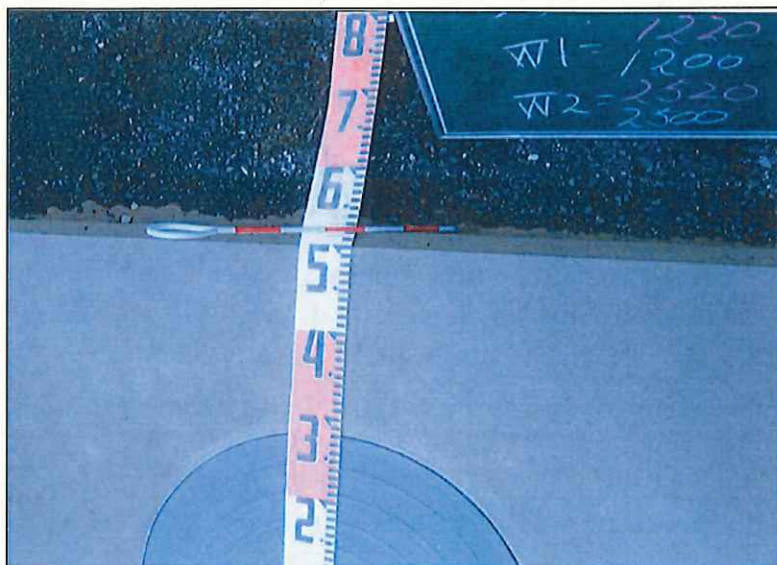

No.: 55
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: スラブコンクリート
出来形確認

計画値 W1=1200

W2=2500

t=100

実測値

W2=2520



No.: 56
工種: 上部スラブ工

写真タイトル: スラブコンクリート
出来形確認


計画値 W1=1200

W2=2500

t=100

実測値

t=100

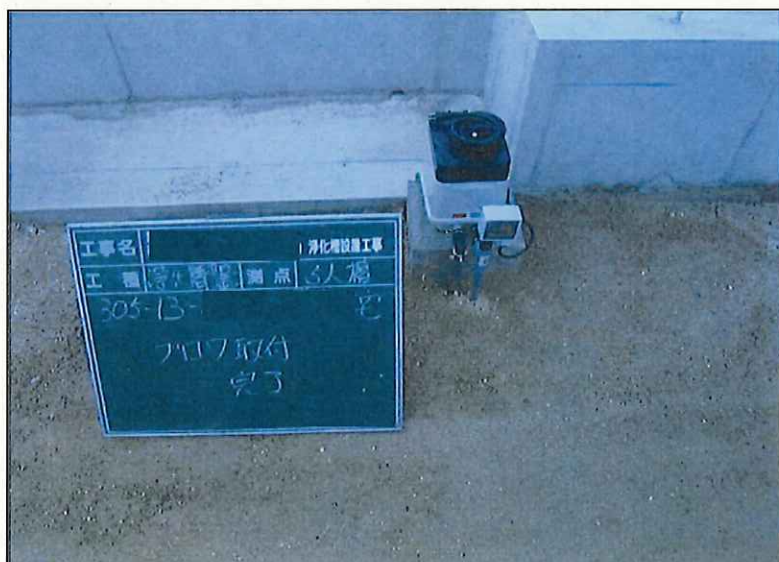

No.: 57
工種: ブロワ据付工

写真タイトル: ブロワ据付完了



No.: 58
工種: その他

写真タイトル: 生コンクリート
試験状況



No.: 59
工種: その他

写真タイトル: コンクリート
圧縮強度試験状況

新規入場時等教育実施報告書

事業所の名称: 市営浄化槽工事〇〇地区(その〇)浄化槽設置工事

現場代理人氏名 浄化槽太郎
(現場責任者)

項 目	適 用	
教育の種類	新規入場時	雇用時 送り出し時
実施日時	平成〇〇年△△月××日 開始 9:00 ~ 終了 12:00(3時間)	
実施場所	自社会議室	
教育方法	講義、DVD	
教育内容	1 本工事の概要について 2 機械の取扱い及び点検について 3 作業の内容について 4 緊急時の連絡、応急措置について 5 浄化槽工事の事故例について	
講師	浄化槽太郎	
受講者指名 (受講者自筆)		
資料	建設業新規入場者教育用マニュアル DVD 建設現場の安全指導5つのポイント(13分) 失敗事例>調査不足で作業をし作業員が土留矢板に挟まる 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 浄化槽設置工事の死亡事故例 3件	

危険予知活動・安全日報

工事名 市営浄化槽事業〇〇地区(その〇)浄化槽設置工事

4月 1 日 8 時 30 分 実施

☆本日の作業内容

掘削、床掘

土留め矢板、支保工設置

☆危険のポイント(どんな危険があるか)

地山が崩壊し、人が埋まる

人力併用作業のため、機械と接触する

土留め矢板が倒れ、人が挟まる

☆本日の行動目標(だから私達はこうします)

地山を点検し、見張りを行い作業する

合図を確認して作業する

土留め矢板は、建込み後、直ちに支保工を設置するものとし、見張りを怠らない。

リーダー氏名	浄化槽太郎	作業員数	4 名
参加者サイン	本日の体調(良好...◎、普通...○、不調...×)		
〇〇××	◎	備考欄	
浄化槽太郎	○		
浄化槽次郎	○		
山田花子	○		
原直子	○		

主 名 業 者 表 代 事 株 式 会 社 ○ ○ 工 務 店 印

[illegible]
